



REGIONE SARDEGNA

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMUNE DI SERRENTI

FORNITURA E POSA DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL COMUNE DI SERRENTI

- Municipio
- Scuola Elementare di via E.D' Arborea
- Scuola Elementare di via Roma

Programma R.A.S. per "Interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici (art.15 comma 7 Legge Finanziaria 2007)"

CRONOPROGRAMMA LAVORI

- PROGETTO DEFINITIVO-ESCLUSIVO




COMUNE DI SERRENTI

VIA NAZIONALE N°182 09027 SERRENTI (VS)
Tel.070915191 – Fax.0709159791 WWW.comune.serrenti.ca.it

Cronoprogramma lavori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL COMUNE DI SERRENTI (Art.35 D.P.R. N°554/99)										
CATEGORIE DI LAVORO DEI CORPI D'OPERA	Distribuzione Settimanale degli Importi delle Categorie di Lavoro									IMPORTO DI CIASCUNA FASE
AVVIO DI CANTIERE: OPERE VARIE DI ACCANTIERAMENTO, RECINZIONI, BARACCAMENTI, ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI CANTIERE , DISACCANTIERAMENTO.	€ 3.543,38								€ 3.543,38	€ 7.086,75
NUOVA COPERTURA E PREPARAZIONE COPERTURAE ESISTENTI IDONEE A RICEVERE GUIDE E MODULI FOTOVOLTAICI		€ 25.814,41	€ 25.814,41							€ 51.628,81
POSA GUIDE E MODULI FOTOVOLTAICI			€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 42.750,00				€ 171.000,00
LINEE ELETTRICHE ESTERNE					€ 2.333,33	€ 2.333,33	€ 2.333,33			€ 7.000,00
POSA LINEE INTERNE E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE: INVERTER E QUADRI ELETTRICI E BOX ALLOGGIAMENTO QUADRI E INVERTER							€ 19.000,00	€ 19.000,00		€ 38.000,00
OPERE DI FINITURA E COLLAUDO DELL'IMPIANTO									€ -	€ -
Parziali	€ 3.543,38	€ 25.814,41	€ 68.564,41	€ 42.750,00	€ 45.083,33	€ 45.083,33	€ 21.333,33	€ 19.000,00	€ 3.543,38	€ 274.715,56
Progressivi	€ 3.543,38	€ 29.357,78	€ 97.922,19	€ 140.672,19	€ 185.755,52	€ 230.838,85	€ 252.172,19	€ 271.172,19	€ 274.715,56	
N° settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Grafico Cronoprogramma lavori

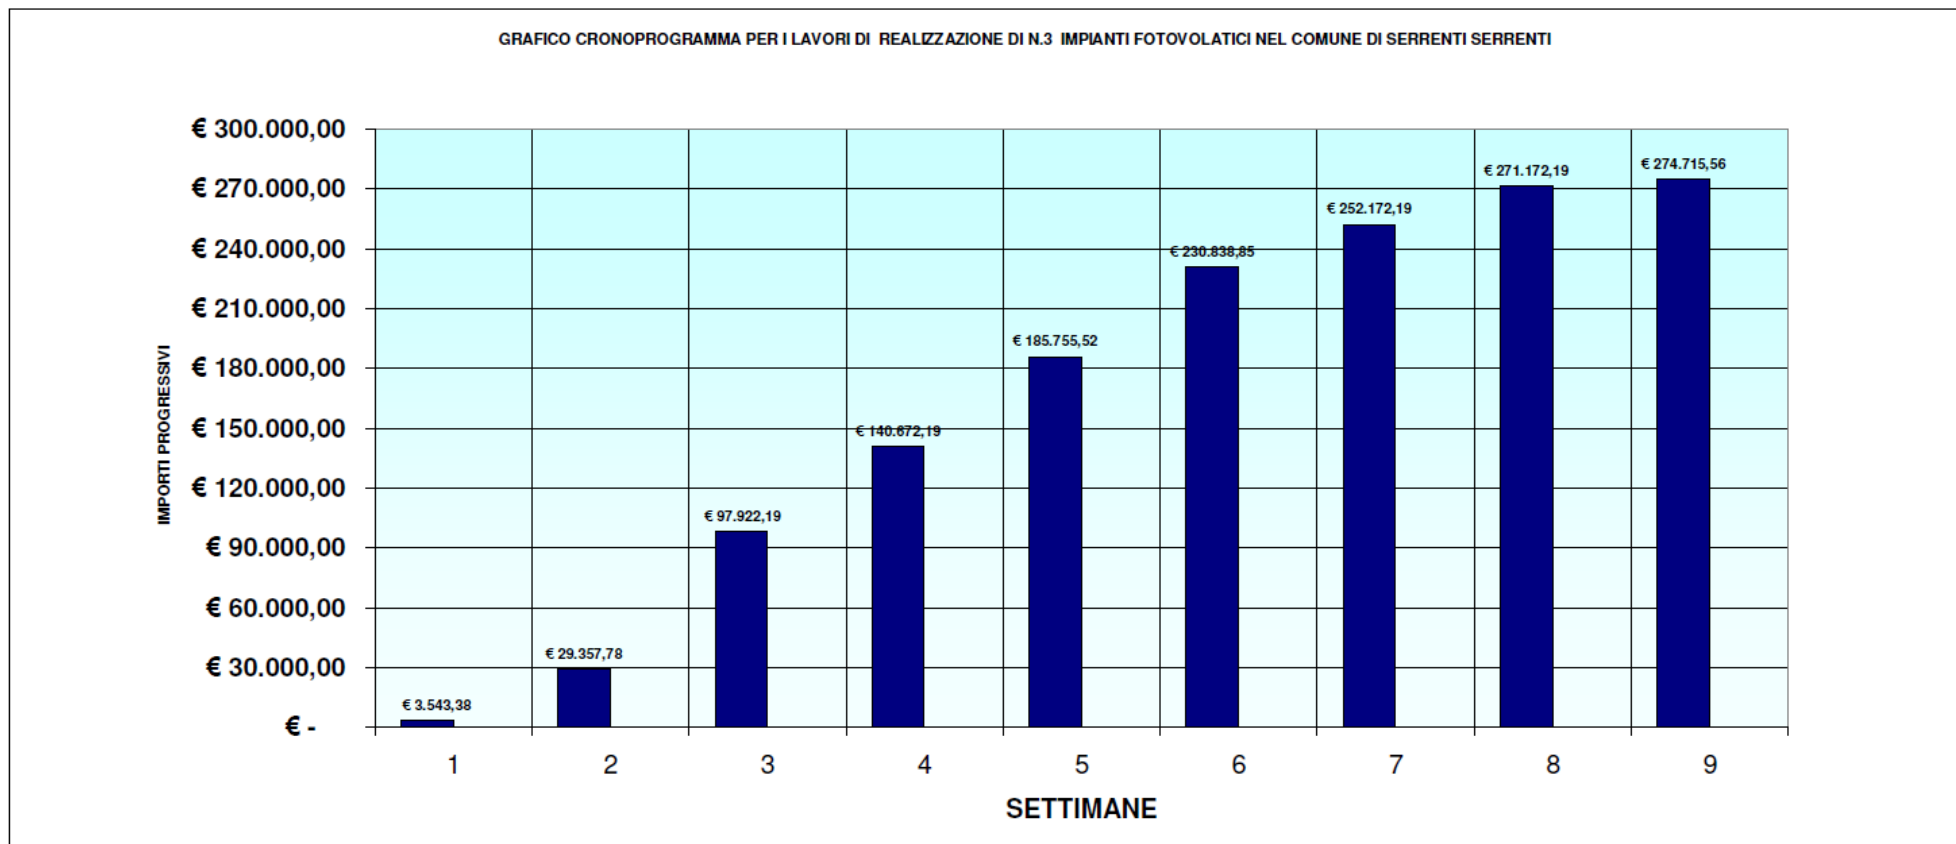

SERRENTI febbraio 2011

Il Progettista
Ing. Giovanni Musio
